

Voortgangsrapportage KNA 5.0

Aan: Archeologisch werkveld
Datum: 13 december 2022
Van: Jelle de Boer, SIKB

Inleiding

In het Jaarplan Archeologie 2022 heeft het CCvD Archeologie van SIKB besloten tot de ontwikkeling van een nieuwe versie van de KNA: de KNA 5.0. Op 5 oktober 2022 heeft zij hiervoor het 'Projectplan Ontwikkeling KNA 5.0' vastgesteld.

Gelet op het belang van het project voor het archeologische werkveld, de doorlooptijd van het project (2 jaar) en het grote aantal betrokkenen, wordt periodiek een voortgangsrapportage opgesteld. Deze dient onder andere om het archeologische werkveld te informeren over voortgang en verwachtingen.

Voor u ligt de Voortgangsrapportage KNA 5.0, zoals behandeld in het CCvD Archeologie van 12 december 2022.

Voortgang algemene projectzaken

Bemensing

Uitgangspunten

De organisatie bestaat uit een Regiegroep en Begeleidingscommissie. Zij wordt ondersteund door Jelle de Boer (projectleider/rapporteur) met ondersteuning van Esther Wieringa (secretaris CCvD Archeologie).

In bijlage 1 is de invulling van de Regiegroep en Begeleidingscommissie gegeven.

Aandachtspunt

Door lengte van het traject en mogelijk een daarmee samenhangend 'wisselend enthousiasme' is de continuïteit van bemensing gedurende het project een blijvend aandachtspunt.

Issues

Er zijn op dit moment geen issues, het project volgt de oorspronkelijke planning.

Planning

Uitgangspunten

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd met als milestones

- **29 maart 2023:** CCvD besluit over definitieve scope (deelproduct 1) en de nieuwe structuur (deelproduct 2)
- **12 december 2023:** CCvD besluit over concept-KNA5.0, CCvD en directie SIKB over vlp. digitale structuur
- **Juni 2024:** CCvD besluit over definitieve tekst KNA 5.0 Directie over definitieve digitale structuur
- **Oktober 2024:** Inwerkingtreding KNA 5.0 na acceptatie RvA en OCW, inwerkingtreding digitale systeem na praktijktesten en acceptatie SIKB

Voor een schematisch overzicht van de hoofdplanning alsmede de detailplanning voor de periode tot 29 maart 2023 wordt verwezen naar bijlage 3a en 3b.

Issues:

Er zijn op dit moment geen issues, het project volgt de oorspronkelijke planning.

Communicatie

Uitgangspunten

Er zijn diverse typen communicatie gedefinieerd. Onderdelen zijn o.a. de interactie met het archeologisch veld, de (project)rapportages aan CCvD en de afstemming met de achterbannen. Door de Regiegroep is een communicatieplan vastgesteld dat hierin voorziet.

Voor de noodzakelijke interactie met de achterban wordt een apart Platform voorzien (start na 29 maart 2023). Tevens worden er twee veldraadplegingen (25 januari 2023 en januari/februari 2024) en een openbare reactieronde voorzien en is het veld via de vertegenwoordigende organisaties betrokken in allerlei werkgroepen.

Aandachtspunt

Gelet op het tijdsplan van het project – en de daarin benodigde voortgang – is het snel kunnen delen van informatie van groot belang. Voor de individuele leden van Regiegroep en Begeleidingscommissie is een achterban / achtervang om snel en tijdig mee te kunnen schakelen een belangrijk aandachtspunt.

Issues

Er zijn op dit moment geen issues.

Voortgang inhoudelijke zaken

Scope KNA 5.0

Uitgangspunten

Op 29 maart 2023 stelt het CCvD de definitieve inhoudelijke scope van het project KNA 5.0 vast. Basis voor de inhoudelijke scope zijn de elf onderwerpen uit bijlage 1 van het Projectplan aangevuld met eventuele nieuwe onderwerpen vanuit het veld.

Uitwerking hiervan moet leiden tot een definitief advies van de Regiegroep dat wordt vastgesteld op 8 maart 2023, met per onderwerp een advies om het al dan niet mee te nemen in KNA 5.0.

Voor de input vanuit het veld wordt gebruik gemaakt van bestaande overleggen: o.a. KNA Gebruikersgroep, Werkgroep deponeren/conservieren, harmonisatie-overleg certificeerders en ronde-tafel-overleg Ba/Ma. Daarnaast is er aanvullend overleg met afgebakende groepen of partijen (bijv. de waterbodensector en de 'wetenschap') (zie ook bijlage 2).

Naast genoemde overleggen, wordt 25 januari februari 2023 een veldraadpleging voorzien. Hier kan een bredere kring belangstellenden zich uitspreken over de verschillende onderwerpen. De verzamelde input wordt vervolgens binnen de Begeleidingscommissie besproken (gerubriceerd, beoordeeld, aangevuld, genuanceerd, etc.). Dit moet leiden tot een advies aan de Regiegroep op 8 maart 2023. De Regiegroep zal vervolgens een definitief advies vaststellen ten behoeve van het CCvD.

De organisatie van de overleggen en werkgroepen is in handen van secretaris CCvD (bestaande overleggen) en de projectleider (aanvullende overleggen).

Issues

Binnen de reeds gevoerde overleggen zijn (voorlopig) zes aanvullende onderwerpen geopperd voor de scope KNA 5.0. Dit betreft waterbodemarcheologie, positie van de Bachelor/Master, positie van het specialistisch onderzoek, data-uitwisseling, transparante structuur voor derden en herziening BRL. Deze onderwerpen worden meegenomen – via de Begeleidingscommissie en de Regiegroep – in het definitieve advies.

Er zijn op dit moment geen andere issues.

Nieuwe structuur

Uitgangspunten

Op 29 maart 2023 stelt het CCvD de voorlopige structuur van de KNA 5.0 vast. Basis hiervoor zijn de uitgangspunten zoals in het Projectplan zijn opgenomen, te weten:

- de huidige en toekomstige werkprocessen in het archeologisch werkveld
- het eenvoudig kunnen toepassen op organisatieniveau (kwaliteitssysteem) en projecten
- modulaire structuur voor digitalisering van de KNA/BRL
- modulaire structuur voor efficiënter beheer en onderhoud (en wijzigingen) van KNA/BRL

Deze worden verrijkt met (1) reacties vanuit het veld en (2) reacties / input vanuit experts op gebied van certificering, inrichting van processen etc.

Uitwerking hiervan moet leiden tot een definitief advies van de Regiegroep dat wordt vastgesteld op 8 maart 2023.

Voor het verzamelen van input vanuit het veld wordt gebruik gemaakt van de KNA Gebruikersgroep, het harmonisatie-overleg van de certificeerders en de Begeleidingscommissie KNA 5.0. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van individuele gesprekken met aantal experts (zie ook bijlage 2).

De organisatie van de overleggen ligt bij de projectleider.

Issues

Er zijn op dit moment geen issues.

Bijlage 1 Deelnemers projectstructuur KNA 5.0

Samenstelling Regiegroep KNA 5.0

Organisatie/achterban	Deelnemer
<i>Leden:</i>	
Specialisten	Kinie Esser
Rijk (RCE)	Bjørn Smit (vz)
Opgravende bedrijven (MKB)	Hans Koopmanschap
Opgravende bedrijven (grootbedrijf)	Henk van de Velde
Gemeenten (bevoegd gezag / opdrachtgever)	Bart Vermeulen
IPO / Provinciale depots	Suzanne Wentink
CCvD-SIKB	Esther Wieringa
<i>Agendaleden:</i>	
Rijkswaterstaat	Eli Gehasse
Certificerende instellingen	Dan Vis
<i>Facilitering:</i>	
SIKB (projectleider)	Jelle de Boer

Samenstelling Begeleidingscommissie KNA 5.0

Organisatie/achterban	Deelnemer
<i>Onafhankelijk voorzitter:</i>	David van den Burg
<i>Leden:</i>	
BAP/SAMPL	Jordy Aal
RCE	Jeroen Bouwmeester
VOiA	Michiel Huisman
Certificerende instellingen	Eline Jonkergouw
KNA Gebruikersgroep	Erwin van der Klooster
IPO / Provinciale depots	Marijke Nieuwenhuis
NVAO	Arjan Schutte
Rijkswaterstaat	Edmee Sleijpen
CGA	Daniël Stiller
Archon/Saxion	Femke Thomas
<i>Agendaleden/vaste plaatsvervangers:</i>	
KNA Gebruikersgroep	Maarten van Dijk
Specialisten	Kinie Esser
Certificerende instellingen	Harald Slump
IPO / Provinciale depots	Lisa Wouters
<i>Facilitering:</i>	
SIKB	Esther Wieringa
SIKB (projectleider)	Jelle de Boer

Bijlage 2

Aanvullend overleg ten behoeve van de inhoudelijke scope

Gevoerd overleg

12-10-2022: Rondetafel Ba/Ma: het hieruit volgende advies wordt in december 2022 in het CCvD verwacht.

01-11-2022: harmonisatie-overleg certificerende instellingen, geheel gewijd aan de KNA5.0.

15-11-2022: KNA Gebruikersgroep: toelichting met verzoek om input

05-12-2022: Begeleidingscommissie KNA 5.0: onderwerpen 'project-algemeen', 'inhoudelijke scope', 'concept-structuur'

Geplande overleggen

PM: overleg waterbodemarcheologie

PM: Ronde tafel-overleg 'wetenschap en kennis'

Aanvullend overleg ten behoeve van de structuur

Gevoerd overleg

17-10-2022: overleg RvA, met onder andere de voornemens tot modulaire structuur

01-11-2022: harmonisatie-overleg certificerende instellingen, geheel gewijd aan de KNA5.0.

15-11-2022: KNA Gebruikersgroep: toelichting met verzoek om input

17-11-2022: oriënterend gesprek SIKB - ICT-leverancier

02-12-2022: tweede oriënterend gesprek SIKB - ICT-leverancier

05-12-2022: Begeleidingscommissie KNA 5.0: onderwerpen 'project-algemeen', 'inhoudelijke scope', 'concept-structuur'


Geplande overleggen

PM: oriënterend gesprek ICT-leverancier / delegatie Regiegroep

PM: overleg waterbodemarcheologie

NB: overleggen met / consultaties van één persoon of organisatie zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Bijlage 3a Hoofdplanning project KNA 5.0

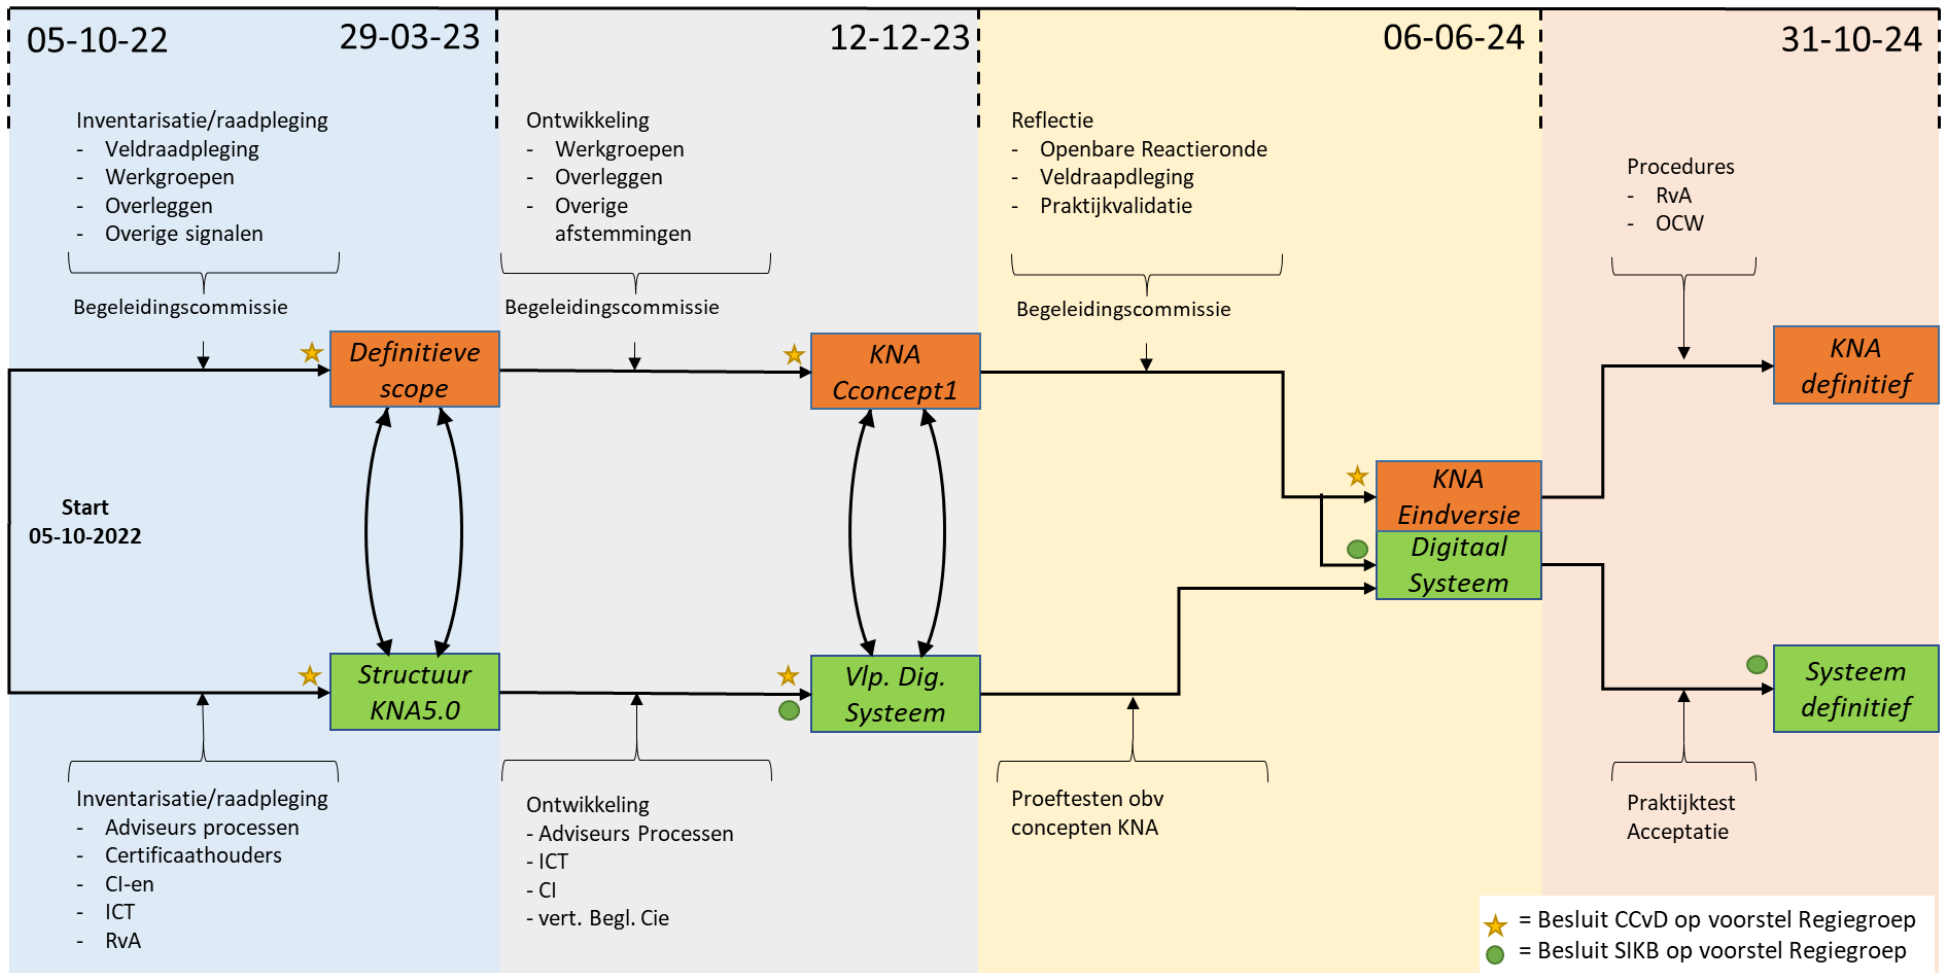

Bijlage 3b Detailplanning fase 1

Datum	Bijeenkomst	Beoogde onderwerpen: proces	Beoogde onderwerpen: inhoud
05-10-22	Regiegroep	Kick-off Afspraken & communicatie	Aanpak bepaling inhoudelijke scope Aanpak structuurbepaling
05-10-22	CCvD	Vaststelling Projectplan	
30-11-22	Regiegroep	Kick-off 2 Bespreking issues Afspraken & communicatie	Voortgang scope Voortgang structuur Vorm advies aan CCvD
05-12-22	Begeleidingscommissie	Kick-off	Behandelen input scope Behandelen input structuur Kennismemen voorgestelde vorm advies
12-12-22	CCvD	Informereren voortgang	Kennismemen voorgestelde vorm advies
24-01-23	Begeleidingscommissie		Behandelen voortgang scope Behandelen voortgang structuur
25-01-23	Veldraadpleging	Informereren project	Reflectie op input scope Reflectie op structuur
08-02-23	Regiegroep	Voortgang Bespreking issues Afspraken & communicatie	Concept inhoudelijke scope Concept structuur Conceptadvies
22-02-23	Begeleidingscommissie	Terugkoppeling Regiegroep Uitkomsten Veldraadpleging	Verwerking laatste informatie Finaal voorstel scope tbv advies Finaal voorstel structuur tbv advies
08-03-23	Regiegroep	Voortgang Bespreking issues Afspraken & communicatie (incl. fase 2)	Eindconcept inhoudelijke scope Eindconcept structuur Vaststellen definitief advies
29-03-23	CCvD		Vaststellen Definitieve scope Vaststellen Structuur
